



LA MIRADA
EL MOSTAKBAL
NEW CAIRO

LA MIRADA MOSTAKBAL CITY

NEWSLETTER

DECEMBER-2024


NEWSLETTER

LA MIRADA MOSTAKBAL CITY



عمارة A4 :-

تم صب اعمدة الروف و جارى سقف الروف.
تم انهاء أعمال مباني الدور الرابع.
تم إنهاء أعمال البياض للدور الثالث الداخلى و جارى أعمال
بياض داخلى لدور الرابع.
تم انهاء أعمال بياض داخلى للبدروم.

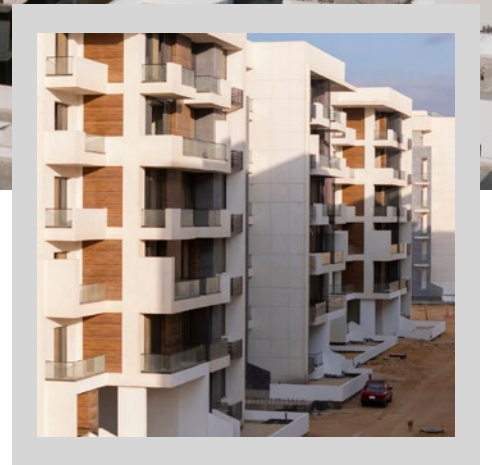

عمارة 3 :-

تم انهاء تشطيب حدائق العملاء
للاوجهات الامامية و جارى العمل على
حدائق العملاء للاوجهة الخلفية
تم تشطيب غرف السطح باقى تركيب
HDF مع تعديل المونيوم الغرفة



عمارة 11 :-

تم انهاء اعمال الرخام الداخلى
جارى انهاء اعمال حدائق العملاء
للاوجهات الامامية و الخلفية و الجانبية
جارى تشطيب ألمونيوم الباب و الشباك
لمدخلين lavender & clavel
تم تركيب الهاتدريل الحديد للسلاالم



عمارة 12 :-

تم انهاء اعمال الكلاينج و الهاتدريل
الزجاجى للاوجهات
تم انهاء اعمال الرخام الداخلى
تم تركيب الهاتدريل الحديد للسلاالم
تم صب خرسانة هليكوبتر لأرضية البدروم



**LA MIRADA
MOSTAKBAL City**

عمارة 14 :-

تم انتهاء اعمال الرخام الداخلى
جارى تشطيب حدائق العملاء للواجهات
الامامية



عمارة 1 :-

تم انتهاء تشطيب حدائق لعملاء
العمارة بالكامل
تم تشطيب غرف السطح على تركيب
HDF



عمارة 2 :-

تم انتهاء تشطيب حدائق لعملاء العمارة
بالكامل
تم تشطيب غرف السطح على تركيب
مع ألمونيوم الغرفة



عمارة D5 :- تم صب القواعد العادية للأساسات



فيلا U08

تم الانتهاء من سقف الدور
الاول و اعمدة الثانى
تم الانتهاء من عزل الاساسات
و اعمال الردم



فيلا U07

تم انتهاء اعمدة الدور الارضى
تم الانتهاء من عزل الاساسات
و اعمال الردم



فيلا T28

تم انتهاء أعمال البياض
الداخلى و الخارجى مع وجود
بعض الملاحظات الطفيفة
على التشطيب للبياض



فيلا T27

جارى أعمال البياض الداخلى
و الخارجى



فيلا U09

تم الانتهاء من سقف الدور الاول
و اعمدة الثانى
تم الانتهاء من عزل الاساسات و
اعمال الردم

LA MIRAD MOSTAKBAL City

مشروع لاميرادا المستقبل هو مشروع عقاري متكامل يهدف إلى
إنشاء مجتمع سكني متكامل الخدمات في مدينة المستقبل
بالقاهرة الجديدة

هذا التقرير يقدم نظرة شاملة على الأعمال الجارية في مشروع
لاميرادا المستقبل حتى تاريخ 26 أكتوبر 2024، ويشمل التقرير
تفاصيل عن حالة تقدم الأعمال في مجالات مختلفة مثل أعمال
المرافق، أعمال البنية التحتية، أعمال التشطيبات، وأعمال الديكور



فيلا 119

جارى اعمال السقف الثانى
اللاخير
تم عزل الاساسات وردمها



فيلا F23

تم صب الاساسات العادية
جارى اعمال الاساسات
المسلحة



فيلا 20F

تم صب الاساسات العادية
جارى اعمال الاساسات
المسلحة



فيلا F25

تم صب الاساسات العادية
جارى اعمال الاساسات
المسلحة



اعمال البحيرة والمرافق واللاندر سكيب.

تم الانتهاء من اعمال الخرسانة و و العزل لجسم البحيرة وجزء
كبير من حوائط اللاندر سكيب
جارى البدء فى التشطيب الداخلى لجسم البحيرة من الداخل

تم الانتهاء من اعمال المرافق للمرحلة الاولى
جارى اعمال الصرف لمرافق المرحلة الثانية لجزء من المرحلة

تم انهاء اعمال تركيب البلدورات و الانترلوك للمشيات خلف
عمارة 1&2


LA MIRADA
EL MOSTAKBAL
NEW CAIRO

مجتمع متكامل، حياة مثالية.
